



Cloacas Argentinas®

● INFORME DE INSPECCION TELEVISADA

Nº

Fecha Inspección 09 - 09 - 2009


Fecha Informe 10 - 09 - 2009

● Sres. Empresa Constructora: Yerbal SRL  
Consorcio de Propietarios Roosevelt 2631  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Presente

● Detalle

Observaciones:  
Videofilmación Cloacal.  
Tecnología aplicada: Videofilmación  
Limpieza Hidrocinética previa: No.  
Cámara y monitor: Color  
Cañería observada en la columna vertical: Plástica de 4 pulgadas  
Comienzo de la filmación: boca de acceso a cañería cloacal principal  
Fin de la filmación: en la red colectora Municipal  
Estado en que se encontraba la cañería al momento de arribar al lugar: desobstruida

Se observó y localizó una junta de goma desplazada que ingresó al interior de la cañería, situada a 3,60 metros del acceso donde se inició la inspección. En las fotos comparativas podemos visualizar uniones en perfecto estado

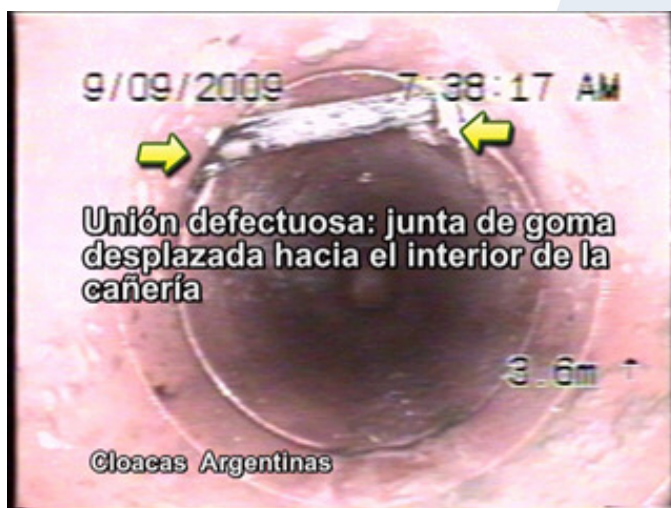

Sugerimos:  
Reemplazar el tramo afectado con la precaución que la obstrucción no se mueva de lugar.  
Nota: Las medidas descriptas son aproximadas, no exactas

Raúl Kanonich: Departamento técnico matrícula OSN nº 30.078




Cloacas Argentinas®

Imágenes de video inspección

Fecha de Inspección

09 - 09 - 2009

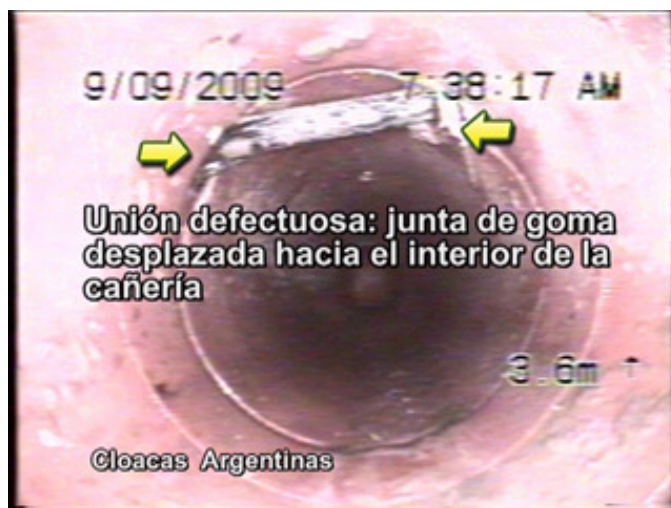



Cloacas Argentinas®

Imágenes de video inspección


Fecha de Inspección

09 - 09 - 2009

Curva con uniones impecables



Unión defectuosa con ingreso de junta de goma



A red colectora

Cañería cloacal principal en  
Planta Baja
